

临沭政务督查

沭政督字〔2018〕142号

临沭县人民政府办公室 关于全县重点民生工程图片现状和手续办理 进展情况的通报

各镇人民政府、街道办事处，县直各单位，经济开发区管委会：

为切实抓好重点民生工程的督促落实，县政府办公室在对2018年实施的民生工程和民生实事实行周调度、月通报的基础上，从中筛选了19项投资额度大、社会关注度高、易于显现形象进度的工程类项目，本着“未开工工程促手续办理、已开工工程促工程进度”的原则，于每月20日—22日以调度手续办理进展、拍摄图片和视频的形式，督促手续办理、记录工程进度、完善工程资料。同时，根据工程手续办理、形象进度和节点计划完成情况与上月进行比对，每月在督查通报中分为“推进快速”、

“推进正常”和“推进缓慢”三个等次。

目前，已开工的 16 项工程中已有常林大街、残疾人托养中心、沭河新村橡胶板、滨河大道等 4 项工程顺利完工，11 项工程正在按照前期制定的节点计划稳步推进，为“推进正常”等次；朝阳街道路建设工程本月应完成亮化及绿化工程，目前牛腿沟桥桥面完成施工，桥以西段完成部分路基，受占迁影响无新进展，为“推进缓慢”等次。

未开工的 3 项工程本月手续办理均无新进展，其中苍源河体育公园项目本月应土建施工、景观节点打造，目前正在进行规划方案、工程方案调整；县高级中学项目本月应进行基础施工，目前正在进行图审，且因无用地指标无法办理招投标手续；县医院综合服务楼建设工程、感染楼建设工程本月应开工建设，目前因无用地指标无法办理招投标手续。

当前已进入全年各项工作的收官扫尾阶段，总体来看，今年大部分工程推进有序，但是存在个别单位重视程度不够，前期手续办理慢、超前谋划不到位、协调配合不积极，督促施工单位措施不力等问题。对此，各级各有关部门务必要引起高度重视，主动对号入座，工作暂时领先的要快马加鞭，在保证工程质量和安全生产的前提下进一步加快进度，争取早日竣工、早日发挥应有的效益；工作暂时被动落后的要对照先进找差距，认真分析原因，制定整改措施，尽快加压奋进。同时，科学谋划好 2019 年民生工程的推进实施，特别是“前期相关手续要力争春节前完成，明

年重点抓工程的施工推进 ,务求当年工程、当年完成、当年见效 ”。
下一步 ,县政府办公室将继续加大督查通报力度 ,对工作进展迟
缓、严重滞后时间节点的单位 ,将在全县范围内予以通报批评。


- 附件：1．重点民生工程分布图
2．重点民生工程进展情况的现状图片
3．重点民生工程手续办理情况一览表

临沭县人民政府办公室

2018年12月25日

临沭

2018年实施的部分重点民生工程分布图

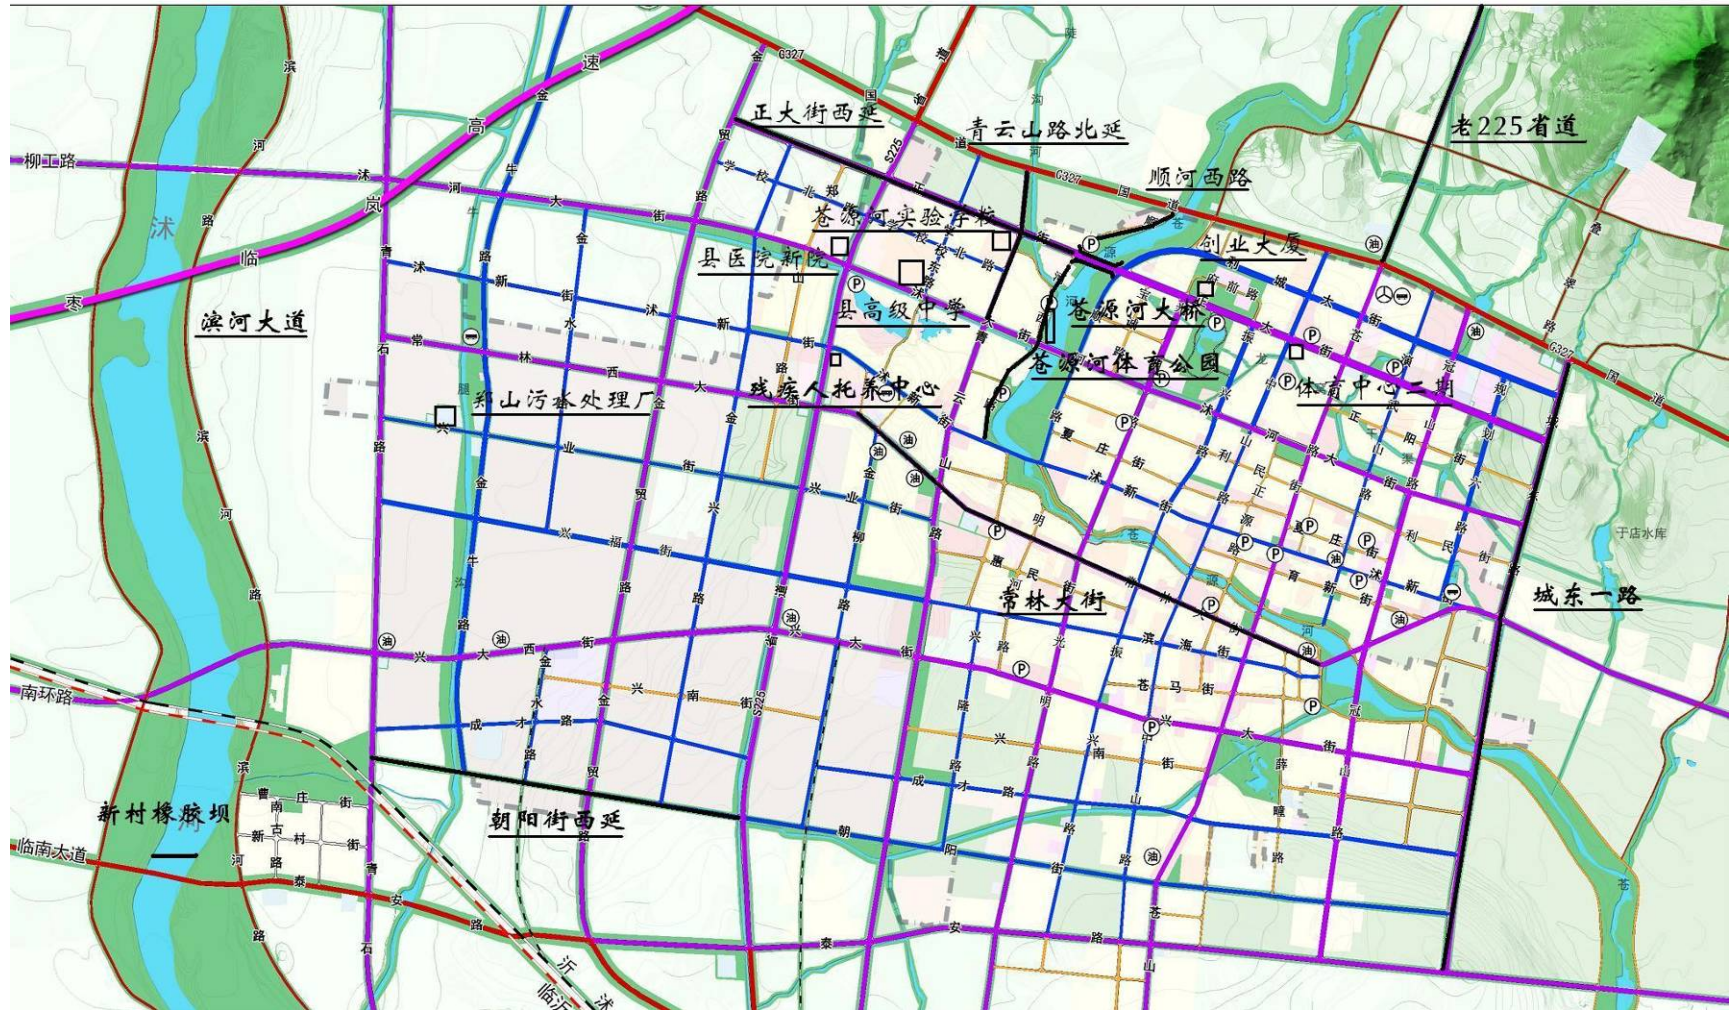

附件 2

重点民生工程进展情况的现状图片

1. 常林大街综合整治工程



(正源路以东段)

8月21日进展情况



(正源路以西段)



9月25日进展情况



10月30日进展情况



(苍山路以西段)

11月19日进展情况



(苍山路以东段)

建设工程已完成。

2. 体育中心二期建设工程



8月21日进展情况



9月25日进展情况



10月30日进展情况



11月19日进展情况



12月24日进展情况

比赛馆场地钢筋绑扎已完成，训练馆正在进行钢结构屋面施工，游泳馆正在进行泳池防水施工。

3. 创业大厦建设工程



8月21日进展情况



9月25日进展情况



10月30日进展情况



11月19日进展情况



12月24日进展情况

继续进行内部装饰和智能化、给排水、消防工程施工。

4. 正大街苍源河大桥建设工程



11月19日进展情况



12月24日进展情况

桥梁吊装已完成，正在进行西侧两跨辅梁内膜施工，铺装桥面钢筋。

5. 青云山路北段道路建设工程



10月30日进展情况



11月19日进展情况



(正大街以南段主管廊正在挖运石方)



(正大街以北段主管廊正在进行浇筑、支模等施工)

12月24日进展情况

6. 正大街西段道路建设工程



(青云山路以东段)



(青云山路以西段)

10月30日进展情况



(青云山路以东段)



(青云山路以西段)

11月19日进展情况



(青云山路以东段)



(青云山路以西段)

12月24日进展情况

道路：对南半幅路基进行分段开挖、回填页岩。**管廊**：东段进行浇筑、防水、回填夯实；西段正在挖运土石方，进行钢筋绑扎、侧墙合模等。

7. 临沭县残疾人托养中心建设工程



8月21日进展情况



9月25日进展情况



10月30日进展情况



11月19日进展情况



12月24日进展情况

绿化、外墙面施工已完成，正在安装电梯。

8. 朝阳街道路建设工程



(牛腿沟桥开始基础施工)
8月21日进展情况



9月25日进展情况



10月30日进展情况



11月19日进展情况



12月24日进展情况

牛腿沟桥：桥板、面层均已完成，剩余护栏未安装。**道路：**桥以东完成路基回填；以西完成部分路基，未清障部分暂不具备施工条件。

9. 郑山污水处理厂建设工程



8月21日进展情况



9月25日进展情况



10月30日进展情况



11月19日进展情况



12月24日进展情况

土建施工完成 95%，进入收尾；设备安装完成 35%。

10 . 沭河新村橡胶坝建设工程



5月19日进展情况



6月20日进展情况



7月19日进展情况



8月21日进展情况



9月主体、泵房等工程已完工。

11. 沭河滨河大道建设工程



9月25日进展情况



10月30日进展情况



11月19日进展情况



12月24日（沙窝大桥北侧）



12月24日（沙窝村北，近景）

已于12月17日全线贯通。

12. 老省道北段改造工程



9月25日进展情况



10月30日进展情况



(指挥部以南段)



(指挥部段以北段)

11月19日进展情况



(王山头村以南段)



(王山头村以北段)

12月24日进展情况

道路压实约 9.6 千米，沥青铺设至王山头村；2 座中桥、5 座小桥主体基本完成，正在进行护栏安装；完成主体工程量的 90%。

13 . 水城建设工程



7月7日进展情况（拆除陡沟桥后，建设主体变更）



（半路河清淤和污水管道铺设）



12月24日进展情况（城东一路夏庄河橡胶坝）

施工单位于12月14日进场施工，森林公园提升泵站、夏庄河橡胶坝、半路河3处施工场地正在作业。

14. 城东一路道路建设工程



(雨污水管道开挖，路面平整)



(苍源河中桥桥墩施工)

10月30日进展情况



(苍源河中桥以北)



(苍源河中桥以南)

11月19日进展情况



(苍源河中桥以北)



(苍源河中桥以南)

12月24日进展情况

边沟开挖 6000 米，雨污水管道各埋设 1000 米；苍源河中桥完成 3#、4#桥墩施工，5#桥墩完成 50%；新完成夏庄河桥梁基础。

15. 苍源河实验学校建设工程



10月30日进展情况



11月19日进展情况



12月24日进展情况

继续进行教学楼、幼教楼基础施工。

附件 3

重点民生工程手续办理情况一览表

1. 苍源河体育公园建设工程

同意项目建设意见	节能备案报告	节能评审批复	项目用地现状图	项目选址意见书
√	√	√	√	√
可研单位确定	环评单位确定	项目用地	勘察单位备案及勘察报告审查	设计备案
√	√	√	√	√
施工图出图及审查	环评影响评价执行标准意见	土地符合规划证明	工程规划许可证	地上附着物清理
√	√	√	√	√
土地预审意见	符合用地规划证明	项目核准批复	项目核准初审意见	土地利用总体规划
○	○	○	○	○
施工单位招标及备案	监理单位招标及备案	施工许可证	场地平整	生活用水管道施工
○	○	×	×	×
临时用电线路施工	公用道路、进场道路、雨污水管道施工			
×	×			

2. 顺河西路道路建设工程

项目选址意见书	同意项目建设意见	项目用地现状图	土地利用总体规划	可研单位确定
√	√	√	√	√
环评单位确定	项目用地	勘察单位备案及勘察报告审查	设计备案	施工图出图及审查
√	√	√	√	√
初步设计审查	环评影响评价执行标准意见	土地符合规划证明	项目核准批复	项目核准初审意见
√	√	√	√	√
符合用地规划证明	用地规划许可证	土地划拨	工程规划许可证	施工单位招标及备案
√	√	√	√	√
监理单位招标及备案	临时用电线路施工	公用道路、进场道路、雨污水管道施工	节能备案报告	节能评审批复
√	√	○	○	○
土地证	施工许可证	地上附着物清理	场地平整	生活用水管道施工
○	×	×	×	×

注：已完成标注√，正在办理标注○，未办理标注×；加粗项为新进展。

3. 临沭县高级中学建设工程

符合用地规划证明	同意项目建设意见	节能备案报告	项目用地现状图	项目选址意见书
√	√	√	√	√
土地符合规划证明	土地利用总体规划	可研单位确定	环评单位确定	水土保持
√	√	√	√	√
地质勘测及详勘报告	水资源论证	环评总量审批	环评报告书上报 评审、批复	环评影响评价执行 标准意见
√	√	√	√	√
项目核准批复	项目核准初审意见	水土保持费用减免	勘查单位备案及 勘察报告审查	节能评审批复
√	√	√	√	√
设计备案	初步设计审查	用地规划许可证	项目用地	施工图出图及审查
√	√	√	○	○
土地证	地上附着物清理	电力接入系统可研及批 复	土地预审意见	临时用电线路施工
○	○	×	×	×
生产用水管道施工	监理单位招标及备 案	施工单位招标及备案	土地划拨	墙改基金征收审核
×	×	×	×	×
生活用水管道施工	工程规划许可证	公用道路、进场道路、雨 污水管道施工	安全生产专篇审 查	建设项目抗震审核 意见书
×	×	×	×	×
消防备案	防雷设施审核	施工许可证	印章刻制	生产用水、中水水质 监测
×	×	×	×	×
气象资料	场地平整	污水接收证明	供水证明	飞灰接收证明
×	×	×	×	×

4. 临沭县人民医院综合服务楼、感染楼建设工程

项目用地	环境与卫生防护距离边界测绘图	可研单位确定	环评单位确定	环评报告书上报评审、批复
○	×	√	√	√
勘查单位备案及勘察报告审查	节能备案报告	节能评审批复	地上附着物清理	环评公众调查问卷
√	○	○	√	√
地质勘测及详勘报告	项目用地现状图	临时用电线路施工	公用道路、进场道路、雨污水管道施工	同意项目建设意见
√	√	√	√	×
社会维稳评价	环评第二次公示	地质灾害评估	水土保持	土地利用总体规划
×	√	×	√	√
项目选址意见书	土地符合规划证明	符合用地规划证明	建设项目抗震审核意见书	场地平整
√	√	√	×	√
生产用水管道施工	生活用水管道施工	电力接入系统可研及批复	土地预审意见	设计备案
√	√	√	○	√
监理单位招标及备案	施工单位招标及备案	用地规划许可证	土地划拨	初步设计审查
×	×	√	×	×
工程规划许可证	施工图出图及审查	安全生产专篇审查	土地证	墙改基金征收审核
○	○	×	×	×
消防备案	防雷设施审核	施工许可证	公司注册	企业名称预核准通知
×	×	×	×	×
印章刻制	项目核准批复	项目核准初审意见	开展前期工作的函	环评影响评价执行标准意见
×	×	×	×	×
环评第一次公示	气象资料	生产用水、中水水质监测	水土保持费用减免	污水接收证明
×	×	×	×	√
同意项目建设证明	供水证明	飞灰接收证明		
×	√	×		
