

# 临沭政务督查

沭政督字〔2018〕120号

---

## 临沭县人民政府办公室 关于全县重点民生工程图片现状和手续办理 进展情况的通报

各镇人民政府、街道办事处，县直各单位，经济开发区管委会：

为切实抓好重点民生工程的督促落实，县政府办公室在对2018年实施的民生工程和民生实事实行周调度、月通报的基础上，从中筛选了19项投资额度大、社会关注度高、易于显现形象进度的工程类项目，本着“未开工工程促手续办理、已开工工程促工程进度”的原则，于每月20日—22日以调度手续办理进展、拍摄图片和视频的形式，督促手续办理、记录工程进度、完善工程资料。同时，根据工程手续办理、形象进度和节点计划完成情况与上月进行比对，每月在督查通报中分为“推进快速”、

“推进正常”和“推进缓慢”三个等次。

目前,已开工的 15 项民生工程中有 14 项工程正在按照前期制定的节点计划稳步推进,为“推进正常”等次;水城建设工程因建设主体调整,重新履行建设手续,暂无新进展。未开工的 4 项工程正在办理前期手续,其中顺河西路道路建设工程完成招投标,县财政部门正在审核施工合同,预计 11 月上旬入场;苍源河体育公园项目正在进行招投标准备工作;县高级中学,县人民医院综合服务楼、感染楼等 2 个项目手续办理无新进展。

当前即将进入冬季,正是抓全年工作任务的最关键时期,各级各有关单位务必要高度重视,在保证工程质量和安全生产的前提下,进一步加快施工进度,倒排工期、挂图作战,争取早日竣工、早日发挥应有的效益;暂未开工的项目要进一步简化审批程序,创新工作方式,提高工作效率,着力破解瓶颈制约,全力以赴抓推进、促开工。下一步,县政府办公室将继续加大对全县重点民生工程进展情况的通报力度,对工作进展迟缓、严重滞后时间节点的单位,在全县范围内予以通报批评。

附件:1. 重点民生工程进展情况的现状图片

2. 重点民生工程手续办理情况一览表

临沭县人民政府办公室

2018 年 11 月 5 日

附件 1

# 重点民生工程进展情况的现状图片

## 1. 常林大街综合整治工程



(正源路以东段)



(正源路以西段)

8月21日进展情况



(苍山路以东段)



(苍山路以西段)


9月25日进展情况



10月30日进展情况

沥青铺筑已完成，剩余部分人行道、绿化工程。

## 2. 体育中心二期建设工程

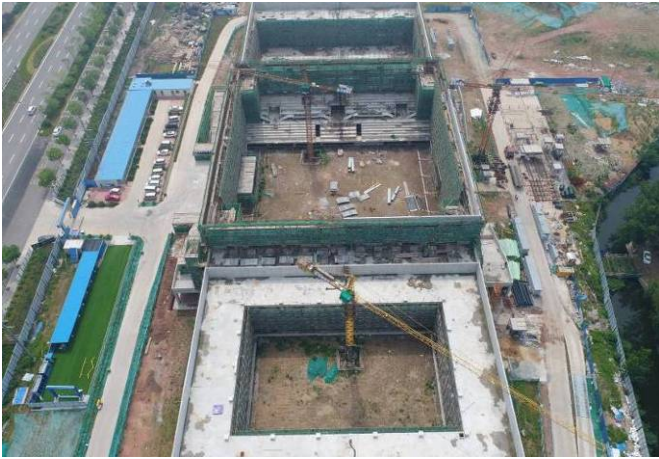

6月20日进展情况



7月19日进展情况



8月21日进展情况



9月25日进展情况



10月30日进展情况

比赛馆钢结构顶升，正在进行1层内粉和室外大理石地面垫层正在施工。

### 3. 创业大厦建设工程



6月20日进展情况



7月19日进展情况



8月21日进展情况



9月25日进展情况



10月30日进展情况

正在进行内部装饰和外部附属工程建设。

#### 4. 正大街苍源河大桥建设工程



6月20日进展情况



7月19日进展情况



8月21日进展情况



9月25日进展情况



10月30日进展情况

南侧系梁浇筑已完成，北侧系梁正在进行混凝土浇筑。

## 5. 青云山路北段道路建设工程



6月20日进展情况



7月19日进展情况



8月21日进展情况



9月25日进展情况



10月30日进展情况  
正在进行管廊开挖，基础施工。

## 6. 正大街西段道路建设工程



( 青云山路以东段 )



( 青云山路以西段 )

8 月 21 日进展情况



( 青云山路以东段 )



( 青云山路以西段 )

9 月 25 日进展情况



( 青云山路以东段 )



( 青云山路以西段 )

10 月 30 日进展情况  
正在进行路基开挖、页岩换填。



## 7. 临沭县残疾人托养中心建设工程



6月20日进展情况



7月19日进展情况



8月21日进展情况



9月25日进展情况



10月30日进展情况

内部装修已完成，正在进行路面硬化、绿化等附属设施建设。

## 8. 朝阳街道路建设工程



6月20日进展情况



7月19日进展情况



8月21日进展情况



9月25日进展情况



(牛腿沟桥以东)



(桥墩)

10月30日进展情况  
完成牛腿沟桥以东路基回填，西岸桥墩施工。

## 9. 郑山污水处理厂建设工程



6月20日进展情况



7月19日进展情况



8月21日进展情况



9月25日进展情况



10月30日进展情况

继续建设生化池、深度处理池、储泥池、二沉池，开始设备安装。

## 10 . 沭河新村橡胶坝建设工程



5月19日进展情况



6月20日进展情况



7月19日进展情况



8月21日进展情况



9月25日进展情况  
主体、泵房等工程已完工。

## 11. 沭河滨河大道建设工程



5月19日进展情况



6月20日进展情况



7月19日进展情况



9月25日进展情况



10月30日进展情况

沙窝大桥以南完成绿化，以北水稳二层铺设至前朱崔。



## 12. 老省道北段改造工程



6月20日进展情况



7月19日进展情况



8月21日进展情况



9月25日进展情况



(庙庄以北段)



(庙庄以南段)

10月30日进展情况  
正在进行边沟开挖、路基及部分桥梁施工。


## 13 . 水城建设工程



7月7日进展情况（拆除陡沟桥）



7月20日进展情况（新陡沟桥基础开挖）

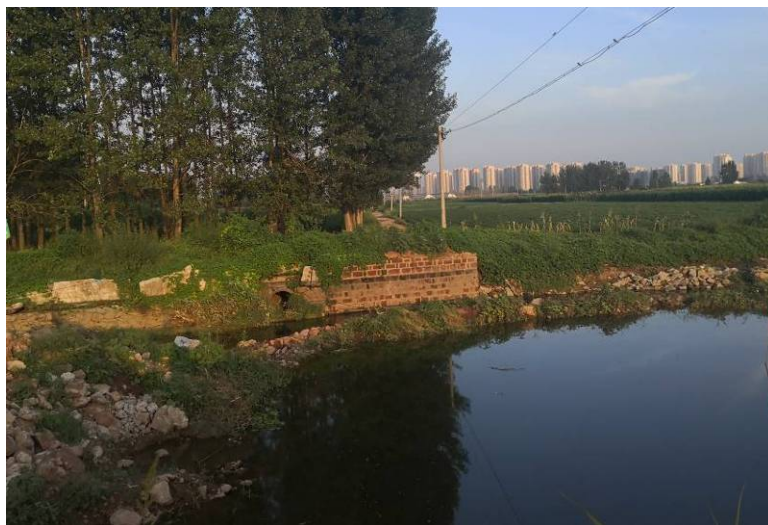

8月20日进展情况

建设主体变更，重新履行手续；继续进行地上附属物清理、老水泥厂征迁工作；陡沟桥建设8月—10月无新进展。

## 14 . 城东一路道路建设工程



10月30日进展情况  
新开工项目，正在进行雨水、污水管道开挖，夏庄河桥梁施工。



## 15 . 苍源河实验学校建设工程



10月30日进展情况  
新开工项目，正在进行教学楼、幼教楼基础施工。

## 附件 2

# 重点民生工程手续办理情况一览表

## 1. 苍源河体育公园建设工程

同意项目建设意见	节能备案报告	节能评审批复	项目用地现状图	项目选址意见书
√	√	√	√	√
可研单位确定	环评单位确定	项目用地	勘察单位备案及勘察报告审查	设计备案
√	√	√	√	√
施工图出图及审查	环评影响评价执行标准意见	土地符合规划证明	工程规划许可证	地上附着物清理
√	√	√	√	√
土地预审意见	符合用地规划证明	项目核准批复	项目核准初审意见	土地利用总体规划
○	○	○	○	○
施工单位招标及备案	<b>监理单位招标及备案</b>	施工许可证	场地平整	生活用水管道施工
○	○	×	×	×
临时用电线路施工	公用道路、进场道路、雨污水管道施工			
×	×			

## 2. 顺河西路道路建设工程

项目选址意见书	同意项目建设意见	项目用地现状图	土地利用总体规划	可研单位确定
√	√	√	√	√
环评单位确定	项目用地	勘察单位备案及勘察报告审查	设计备案	施工图出图及审查
√	√	√	√	√
初步设计审查	环评影响评价执行标准意见	土地符合规划证明	项目核准批复	项目核准初审意见
√	√	√	√	√
符合用地规划证明	用地规划许可证	土地划拨	工程规划许可证	<b>施工单位招标及备案</b>
√	√	√	√	√
<b>监理单位招标及备案</b>	节能备案报告	节能评审批复	土地证	施工许可证
√	○	○	○	×
地上附着物清理	场地平整	临时用电线路施工	公用道路、进场道路、雨污水管道施工	生活用水管道施工
×	×	×	×	×

注：已完成标注√，正在办理标注○，未办理标注×；加粗项为新进展。

### 3. 临沭县高级中学建设工程

符合用地规划证明	同意项目建设意见	节能备案报告	项目用地现状图	项目选址意见书
√	√	√	√	√
土地符合规划证明	土地利用总体规划	可研单位确定	环评单位确定	水土保持
√	√	√	√	√
地质勘测及详勘报告	水资源论证	环评总量审批	环评报告书上报 评审、批复	环评影响评价执行 标准意见
√	√	√	√	√
项目核准批复	项目核准初审意见	水土保持费用减免	勘查单位备案及 勘察报告审查	节能评审批复
√	√	√	√	√
设计备案	初步设计审查	用地规划许可证	项目用地	施工图出图及审查
√	√	√	○	○
土地证	地上附着物清理	电力接入系统可研及批 复	土地预审意见	临时用电线路施工
○	○	×	×	×
生产用水管道施工	监理单位招标及备 案	施工单位招标及备案	土地划拨	墙改基金征收审核
×	×	×	×	×
生活用水管道施工	工程规划许可证	公用道路、进场道路、雨 污水管道施工	安全生产专篇审 查	建设项目抗震审核 意见书
×	×	×	×	×
消防备案	防雷设施审核	施工许可证	印章刻制	生产用水、中水水质 监测
×	×	×	×	×
气象资料	场地平整	污水接收证明	供水证明	飞灰接收证明
×	×	×	×	×

#### 4. 临沭县人民医院综合服务楼、感染楼建设工程

项目用地	环境与卫生防护距离边界测绘图	可研单位确定	环评单位确定	环评报告书上报评审、批复
○	×	×	×	×
勘查单位备案及勘察报告审查	节能备案报告	节能评审批复	地上附着物清理	环评公众调查问卷
×	×	×	×	×
地质勘测及详勘报告	项目用地现状图	临时用电线路施工	公用道路、进场道路、雨污水管道施工	同意项目建设意见
×	×	×	×	×
社会维稳评价	环评第二次公示	地质灾害评估	水土保持	土地利用总体规划
×	×	×	×	×
项目选址意见书	土地符合规划证明	符合用地规划证明	建设项目抗震审核意见书	场地平整
×	×	×	×	×
生产用水管道施工	生活用水管道施工	电力接入系统可研及批复	土地预审意见	设计备案
×	×	×	×	×
监理单位招标及备案	施工单位招标及备案	用地规划许可证	土地划拨	初步设计审查
×	×	×	×	×
工程规划许可证	施工图出图及审查	安全生产专篇审查	土地证	墙改基金征收审核
×	×	×	×	×
消防备案	防雷设施审核	施工许可证	公司注册	企业名称预核准通知
×	×	×	×	×
印章刻制	项目核准批复	项目核准初审意见	开展前期工作的函	环评影响评价执行标准意见
×	×	×	×	×
环评第一次公示	气象资料	生产用水、中水水质监测	水土保持费用减免	污水接收证明
×	×	×	×	×
同意项目建设证明	供水证明	飞灰接收证明		
×	×	×		
